Hazırlanan


Luma Yönetim Kurulu

Hazırlayan

Maya Lindqvist
Ormsund Studio

Belge	Lansman planı
Tarih	30 Ekim 2026
Sürüm	3
Durum	Onaya sunuldu
İçerik	12 bölüm · 7 sayfa

Luma masa lambası: lansman planı

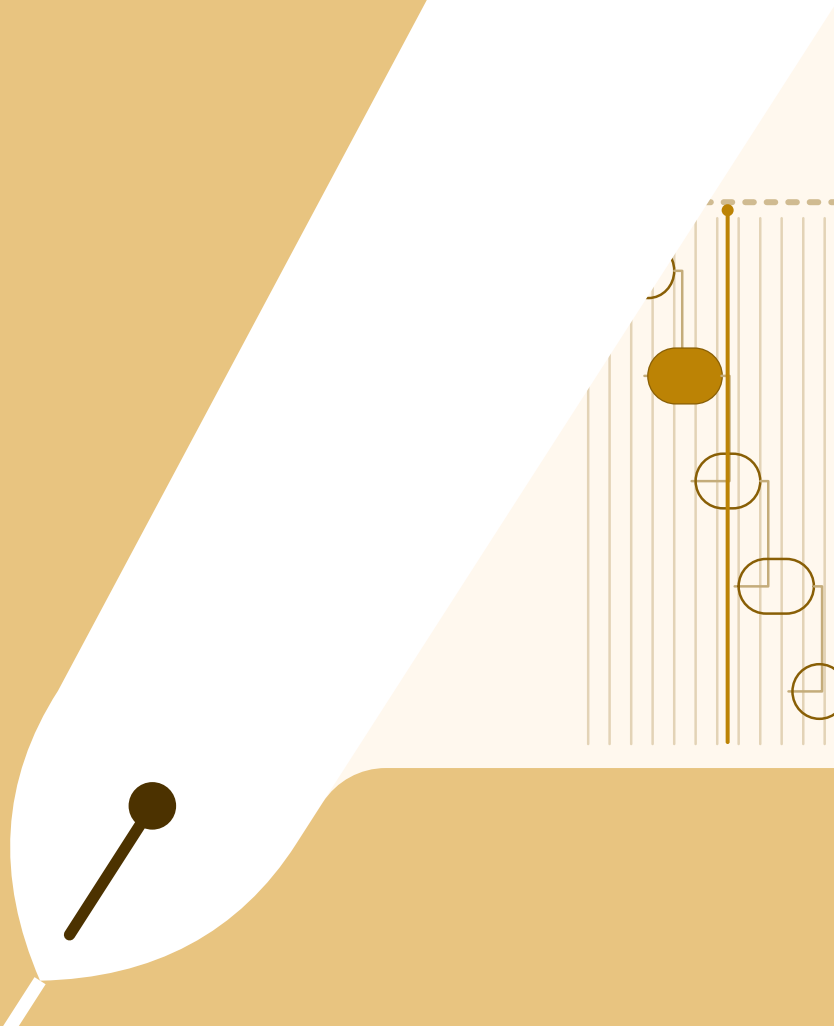

İçindekiler

01	Ürün	2
02	Konumlandırma	3
03	Durum	3
04	Zaman çizelgesi	3
05	Lansman panosu	4
06	Bütçe	4
07	Satış tahmini, ilk 30 gün	4
08	Lansman günü, saat saat	5
09	Riskler	5
10	Kuruldan beklenen kararlar	5
11	Takvim	6
12	Numune ve basın gönderimleri	7

Özet

Luma, kablosuz şarj tabanlı, kısılabilir bir masa lambası. Önce kendi online mağazasında satışa çıkıyor, sonraki üç haftada üç perakende ortağına yayılıyor. Bu belgede planın tamamı var: takvim, bütçe, satış tahmini ve riskler.

Lansman tarihi
26.11.2026

Sorumlu
Maya Lindqvist

İlk 30 gün hedefi
1.200 adet

Fiyat konumu
Orta segment, market lambalarının üstünde

01 Ürün



Luma Sand
Sıcak beyaz abajur, meşe taban. Öne çıkardığımız renk.



Luma Graphite
Mat koyu gri; çok siyah olan masalar için.



Luma Sage
İlk seri 300 adetle sınırlı; yalnızca markanın kendi mağazasında.

02 Konumlandırma

> **Masanızı size geri veren lamba: ışık, şarj ve başka hiçbir şey.**


— **Kimin için:** evden çalışan ve kablolardan bıkmış insanlar
— **Kanıt:** 50.000 saat ömürlü LED, değiştirilebilir abajur, beş yıl garanti
— **Söylemediğimiz şey:** “akıllı”. Uygulama yok, zaten mesele de bu

03 Durum

1	2	3	4	5	6
Araştırma	Prototip	Lansman hazırlığı	Ön siparişler	Lansman	Perakende
Tamamlandı	Tamamlandı	Sürüyor	Bekliyor	Bekliyor	Bekliyor

04 Zaman çizelgesi

Her görev bağlı olduğu görevleri bekler; biri gecikirse ona bağlı olanlar da kayar.

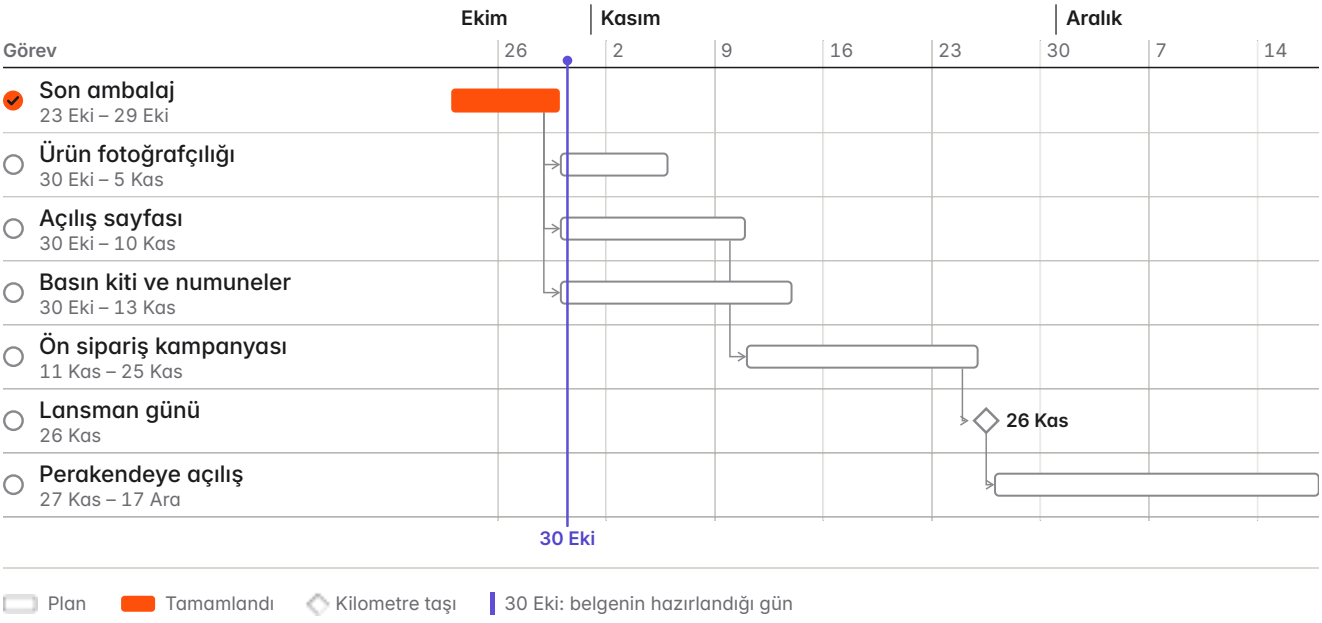

05 Lansman panosu

Yapılacak 3

On iki değerlendirmeciye numune gönder
10 Kas · 1/3 · Erik

Perakende fiyat listesi
17 Kas · Mavi

Müşteri destek yanıtları
İlk gün beklediğimiz on soru.
23 Kas · Yeşil

Sürüyor 2

Açılış sayfası
Ana görsel: ürün çekiminden.
10 Kas · 17:00 · 2/4
Mavi · Erik

Tanıtım filmi, 40 saniye
13 Kas · 1/3 · Kırmızı

Onay bekliyor 1

Ambalaj içi kart
6 Kas · Sarı

Bitti 2

İsim ve marka kontrolü
2/2

Güvenlik sertifikası
1/1

06 Bütçe

Kalem	Planlanan	Şimdiye kadar harcanan	Kalan
Fotoğraf ve film	₺6.500	₺3.400	₺3.100
Açılış sayfası	₺4.200	₺3.800	₺400
Ücretli sosyal medya	₺9.000	₺2.400	₺6.600
İnceleme numuneleri	₺1.800	₺1.650	₺150
Lansman akşamı	₺3.500		₺3.500
Toplam	₺25.000	₺11.250	₺13.750

07 Satış tahmini, ilk 30 gün

Kanal	Adet	Fiyat	Ciro	Pay
Online mağaza	700	₺129	₺90.300	%63
Ön siparişler	300	₺119	₺35.700	%25
Perakende ortakları	200	₺84	₺16.800	%12
Toplam	1.200		₺142.800	%100

08 Lansman günü, saat saat

Saat	Ne oluyor	Kim
08:00	Mağaza yayına giriyor; ödeme ve stokların son kontrolü	Jonas
09:00	8.400 aboneye duyuru e-postası	Maya
10:00	Tanıtım filmi tüm kanallarda	Priya
12:00	İlk rakamlar; önce bozuk olanı düzelt	Herkes
18:00	Stüdyoda lansman akşamı	Maya

09 Riskler

Risk	Ne kadar olası	Bunun için ne yapıyoruz
Fabrikadan sevkiyat geç geliyor	Mümkün	Ön siparişler iki partide gönderilecek; bunu ürün sayfasında belirtin
Sage ilk gün tükeniyor	Olası	“Tükendi” yerine bekleme listesi
Yorumlar lansmandan sonra geliyor	Mümkün	Numuneler on altı gün erken yola çıkıyor

10 Kuruldan beklenen kararlar

Planın takvimde kalması için kuruldan dört karar bekliyoruz. Her tarih, başka hiçbir işi kaydırmayan son gün.

Karar	Sorumlu	Son tarih
Sage ilk serisi: planlandığı gibi 300 adet mi, 500 adet mi	Ürün direktörü	5 Kas
Ön sipariş fiyatı: mağazadaki 129’a karşı 119	Finans direktörü	9 Kas
Lansman akşamı: 3.500’lük bütçenin serbest bırakılması	Genel müdür	12 Kas
Perakende: planlandığı gibi üç ortak mı, beş ortak mı	Satış direktörü	16 Kas

11 Takvim

Kasım 2026

15 etkinlik

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
				1 Ürün fotoğrafçılığı Açılış sayfası Basın kiti ve numuneler		
2 ← Ürün fotoğrafçılığı ← Açılış sayfası ← Basın kiti ve numuneler	**3** 09:00 **Fotoğraf çekimi**	4	5	**6** **Ambalaj içi kart**	7	8
9 ← Açılış sayfası ← Basın kiti ve numuneler	**10** **On iki değerlendir-meciye numune gönder** 17:00 **Açılış sayfası**	**11** Ön sipariş kampanyası 10:00 **Ön siparişler açılıyor**	12	**13** **Tanıtım filmi, 40 saniye**	14	15
16 ← Ön sipariş kampanyası	**17** **Perakende fiyat listesi**	18	19	20	21	22
23 ← Ön sipariş kampanyası **Müşteri destek yanıtları**	24	25	**26** **Lansman günü** 18:00 **Lansman akşamı**	27 Perakendeye açılış	28	29
30 ← Perakendeye açılış						

Aralık 2026

2 etkinlik

27 Kas – 17 Ara	Cum – Per		Perakendeye açılış
4 Ara	Cum	14:00	İlk hafta değerlendirmesi

12 Numune ve basın gönderimleri

Lansmandan önce çıkan bütün numuneler, gönderim sırasıyla. On iki değerlendirmecinin numuneleri on altı gün önceden yola çıkıyor.

	Alıcı	Şehir	Renk	Kargo	Durum
01	Ürün fotoğrafçısı	Stockholm	Üç renk	30 Eki	Gönderildi
02	Film stüdyosu	Stockholm	Sand	30 Eki	Gönderildi
03	Büyük mağaza alıcısı	Kopenhag	Sand	2 Kas	Paketlendi
04	Tasarım mağazası alıcısı	Oslo	Graphite	2 Kas	Paketlendi
05	Online mağaza alıcısı	Hamburg	Sand	2 Kas	Paketlendi
06	İç mimar	Göteborg	Sand	4 Kas	Planlandı
07	Ortak çalışma alanı	Berlin	Graphite	4 Kas	Planlandı
08	Mobilya showroomu	Malmö	Graphite	5 Kas	Planlandı
09	Aydınlatma tasarımcısı	Helsinki	Sage	5 Kas	Planlandı
10	Mimarlık ofisi	Aarhus	Sand	6 Kas	Planlandı
11	Butik otel	Kopenhag	Graphite	6 Kas	Planlandı
12	Tasarım dergisi	Londra	Sand	10 Kas	Planlandı
13	Tasarım dergisi	Milano	Sage	10 Kas	Planlandı
14	Teknoloji değerlendirmecisi	Berlin	Graphite	10 Kas	Planlandı
15	Teknoloji değerlendirmecisi	Amsterdam	Sand	10 Kas	Planlandı
16	Video değerlendirmecisi	Stockholm	Sage	10 Kas	Planlandı
17	Video değerlendirmecisi	Londra	Graphite	10 Kas	Planlandı
18	Mimarlık blogu	Kopenhag	Sand	10 Kas	Planlandı
19	Evden çalışma blogu	Oslo	Graphite	10 Kas	Planlandı
20	Dekorasyon dergisi	Paris	Sage	10 Kas	Planlandı
21	Yaşam tarzı podcast’i	Amsterdam	Graphite	10 Kas	Planlandı
22	Teknoloji bülteni	Zürih	Sand	10 Kas	Planlandı
23	Masa düzeni kanalı	Viyana	Graphite	10 Kas	Planlandı
24	Gazetenin ev ve yaşam eki	Stockholm	Sand	11 Kas	Planlandı
25	Hafta sonu eki	Londra	Sage	11 Kas	Planlandı
26	Aydınlatma sektörü dergisi	Frankfurt	Graphite	12 Kas	Planlandı
27	Hediye rehberi editörü	Kopenhag	Sage	12 Kas	Planlandı
28	Radyo programı	Oslo	Sand	12 Kas	Planlandı
29	İç mekân stilisti	Amsterdam	Sage	13 Kas	Planlandı
30	Fuar düzenleyicileri	Milano	Sand	13 Kas	Planlandı
